

◆令和6年 8月度 工事計画表

1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は、**流入管接続、左岸（阪急側）埋戻し、土留壁構築（上ノ川橋付近）**です。作業は主に**昼間作業（8：00～18：00※準備作業含む。一部終日片側交互通行規制、上ノ川橋付近歩道規制）**を予定しています。また、作業時は**大型重機**を使用しますので作業音、振動が発生します。また大型重機回転時に安全確保のため府道の一般車両を一時的に止めることがあります。ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力よろしくお願いいたします。


2. 道路規制のお知らせ

流入管接続のため下記工事進捗図の箇所にて**終日片側交互通行規制**を予定しています。天候状況によりますが8月上旬に規制解除予定です。  
 また土留壁構築のため、上ノ川橋付近にて一部歩道の規制を行います。作業時のみの規制になります。  
 交通規制時は、常にガードマンを配置します。

3. その他ご連絡事項


万が一、上の川の水位が上昇して、**水位が1/2に達した時は、注意喚起放送を実施**します。また、**放送を確実にするための訓練（試験放送）**を月1回（第3水曜日午前10時から2分間程度（今月は第3水曜日の8/21※雨天の場合は8/22、次は8/23に順延））**実施**します。ご迷惑をおかけいたしますがご協力よろしくお願いいたします。

・**上の川水位状況ライブを配信中**  
 YouTubeアドレス  
<https://www.youtube.com/@user-pz9iy1kg7j/featured>



※カメラの通信状況により一時的に見れない場合があります。↑

4. 工事進捗図（工事状況図 7/25時点）

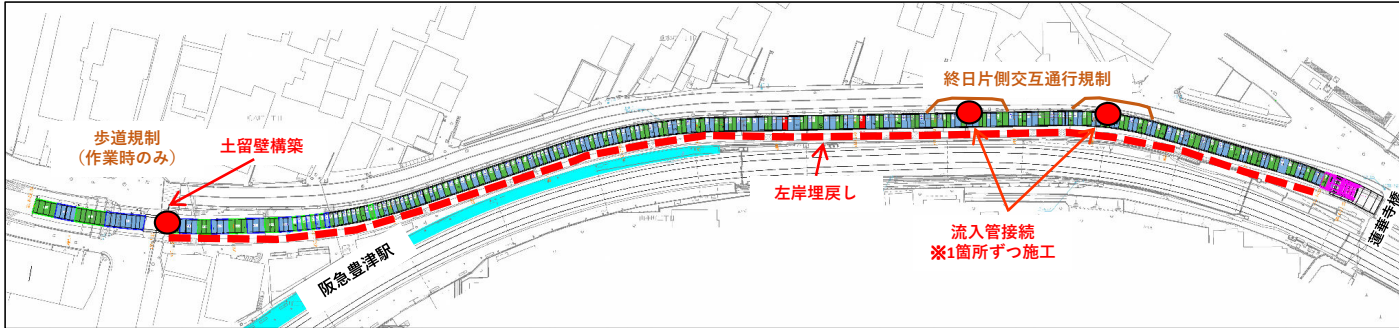

4. 月間工程表（8月）

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	31日
・流入管接続	←→ 昼間作業（終日片側交互規制）		夏期休暇 8/10~18			
・左岸（阪急側）埋戻し	←→ 昼間作業（規制なし）				→ 昼間作業（規制なし）	
・土留壁構築（上ノ川橋）					→ 昼間作業（歩道規制）	

※雨天等天候状況、作業進捗により休日（土日祝）作業を行います。  
 ※昼間作業 8：00～18：00 一部終日片側交互通行規制・歩道規制

5. 今後の予定

本工事は今年度8月末までに完了することを予定していましたが、降雨の影響で工事の進捗が遅れているため、**工事の完了時期が今年度12月末になる予定です。**  
 一方で、**本工事が完成した一部区間を吹田市に引渡すこと**で、**全体工程（遊歩道整備など）には、遅れが生じないように進めます。**  
 引き続き、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

	令和6年度 8月末	12月末	令和7年度 4月末	3月末
全体工程(遊歩道整備など)	→			
・基盤整備工事		→ R6年度12月末まで延期		
・上面整備工事			→ 完成した区間を引渡す	

※上面整備工事は、吹田市発注工事になります。令和7年度末に完了予定です。  
 上面整備工事のお問い合わせ先：吹田市土木部地域整備推進室 06-6833-6871

【本工事に関するお問い合わせ先】

《工事施工者》 大鉄工業(株) 上の川作業所  
 担当：天野・田中  
 (連絡先) 06-6319-8025

《発注者》 大阪府茨木土木事務所 河川砂防グループ  
 担当：竹内・石川  
 (連絡先) 072-627-1121  
 内線559
