

◆令和5年 11月度 工事計画表

1. 工事再開について

平素は、本工事にご理解、ご協力をいただきましてありがとうございます。

9月12日の溢水事象により地域住民の皆様にご迷惑、ご心配をお掛け致し誠に申し訳ございませんでした。今回の事象により工事を一時中断しておりましたが、溢水対策が整いましたので工事を再開いたします。


2. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は**溢水対策、工事再開準備工、オープンシールド掘進、阪急防護柵設置**です。作業は主に**昼間作業（8：00～17：00 ※準備作業を含む。片側交互通行規制）**、一部大型資機材の搬入出作業については**夜間作業（21：00～翌5：00 ※準備作業を含む。片側交互通行規制）**を予定しています。

作業時は**大型クレーン、重機**を使用しますので作業音、振動が発生します。また大型クレーン旋回時に安全確保のため府道の一般車両を一時的に止めることがあります。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いたします。

3. 工事進捗図（工事状況図）

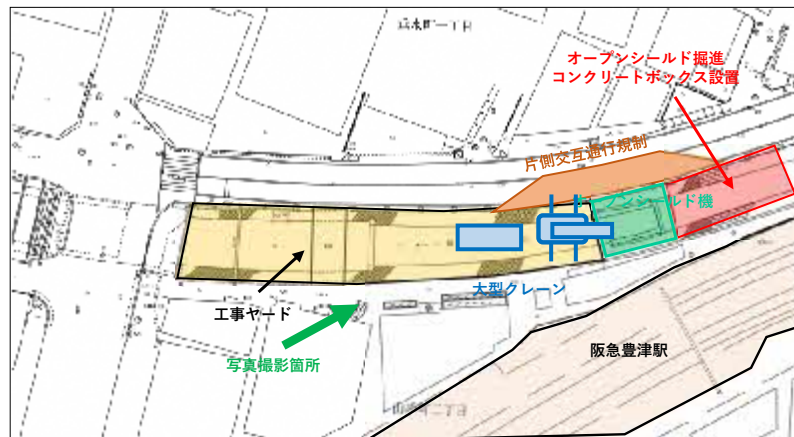

4. 月間工程表（11月）

作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	30日
・ 溢水対策 ・ 工事再開準備工	← 昼間作業 →					
・ オープンシールド掘進 ・ コンクリートボックス設置	← 昼間作業（一部夜間作業あり） →					
・ 阪急防護柵設置	← 夜間作業 →					

- ※ 雨天等天候状況、作業進捗により休日（土日祝）作業あり
- ※ 昼間作業 8：00～17：00 片側交互通行規制あり
- ※ 夜間作業 21：00～翌5：00 片側交互通行規制あり

令和6年1月以降は作業終了時間を17時→21時に延伸する予定です。

今回の溢水事象をうけて、雨がよく降る時期（6月中旬～10月中旬）の工事をなるべく短くして、**本工事の工期を短縮**させるためのものです。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いたします。

5. 工事現況写真（令和5年10月27日撮影）



・ 上の川水位状況ライブを配信中

YouTube アドレス

<https://www.youtube.com/@user-pz9iy1kg7j/featured>



←QRコード

6. その他ご連絡事項

万が一、上の川の水位が上昇して、**水位が1/2に達した時は、注意喚起放送を実施**します。また、**放送を確実にするための訓練（試験放送）を月1回（第3月曜日午前10時から5分間程度（今月は11/20※雨天の場合は11/21、次は11/22に順延））実施**します。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いたします。

【本工事に関するお問い合わせ先】

《工事施工者》 大鉄工業(株) 上の川作業所 担当：天野・田中
(連絡先) 06-6319-8025

《発注者》 大阪府茨木土木事務所 河川砂防グループ 担当：竹内・石川
(連絡先) 072-627-1121 内線559
