

◆令和6年 2月度 工事計画表

1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は**オープンシールド掘進・ガイドコンクリート工**です。作業は主に**昼間作業（8：00～18：00※準備作業含む。片側交互通行規制）**を予定しています。大型重機等の搬入出で一部夜間作業を行うことがあります。ガイドコンクリート工についてはコンクリート打設時、資材荷卸し時に数時間の**片側交互通行規制**を行うことがあります。作業時は**大型クレーン、重機**を使用しますので作業音、振動が発生します。また大型クレーン旋回時に安全確保のため府道の一般車両を一時的に止めることがあります。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いたします。


工事の進捗状況に応じて、昼間作業終了時間を21時まで延伸することがあります。

令和5年9月の溢水事象をうけて、雨がよく降る時期（6月中旬～10月中旬）の工事をなるべく短くして、**本工事の工期を短縮**させるためのものです。

なお、河川内のコンクリート撤去など音が大きい作業は17時までに終了します。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いたします。

2. 工事進捗図（工事状況図）

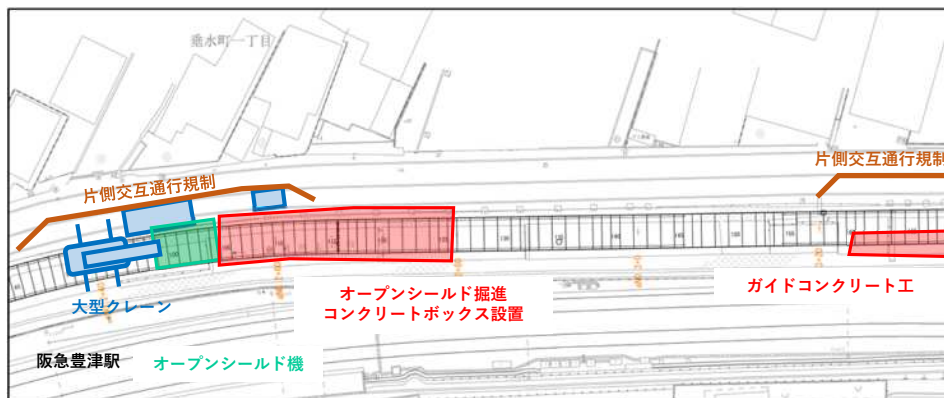

3. 月間工程表（2月）

	5日	10日	15日	20日	25日	29日
ガイドコンクリート工			← 昼間作業 →			
オープンシールド掘進 コンクリートボックス設置	← 昼間作業 → (大型重機等の搬入出時は一部夜間作業あり)					

- ・雨天等天候状況、作業進捗により休日（土日祝）作業あり
- ・昼間作業 8：00～18：00 片側交互通行規制あり※作業終了時間を21時まで延伸することがあります。
- ・夜間作業 21：00～翌5：00 片側交互通行規制あり※数時間程度

4. 工事現況写真（令和6年1月23日撮影）



・上の川水位状況ライブを配信中

YouTube アドレス
<https://www.youtube.com/@user-pz9iy1kg7i/featured>

※カメラの通信状況により一時的に見れない場合があります。



←QRコード

5. その他ご連絡事項

万が一、上の川の水位が上昇して、**水位が1/2に達した時は、注意喚起放送を実施**します。また、**放送を確実にを行うための訓練（試験放送）を月1回（第3月曜日午前10時から2分間程度（今月は第3月曜日の2/19※雨天の場合は2/20、次は2/21に順延））実施**します。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力よろしくお願いたします。

【本工事に関するお問い合わせ先】

《工事施工者》 大鉄工業(株) 上の川作業所 担当：天野・田中
(連絡先) 06-6319-8025

《発注者》 大阪府茨木土木事務所 河川砂防グループ 担当：竹内・石川
(連絡先) 072-627-1121 内線559
