

様式1

吹 田 市 長 あて

電話 (06) 6920 — 0006

注1 法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

環境まちづくりの概要(1)

事業者の環境方針	
当該事業における環境まちづくり方針	地域環境に対して、汚染の予防と持続可能な環境負荷の削減に取り組みます。

1. 実施率と主な実施内容

1-1. 工事中

実施率

98パーセント

(小数点第2位以下切り捨て)

実施する・一部実施するの項目数


49

=

該当なしを除いた項目数

50

一:方針(案)

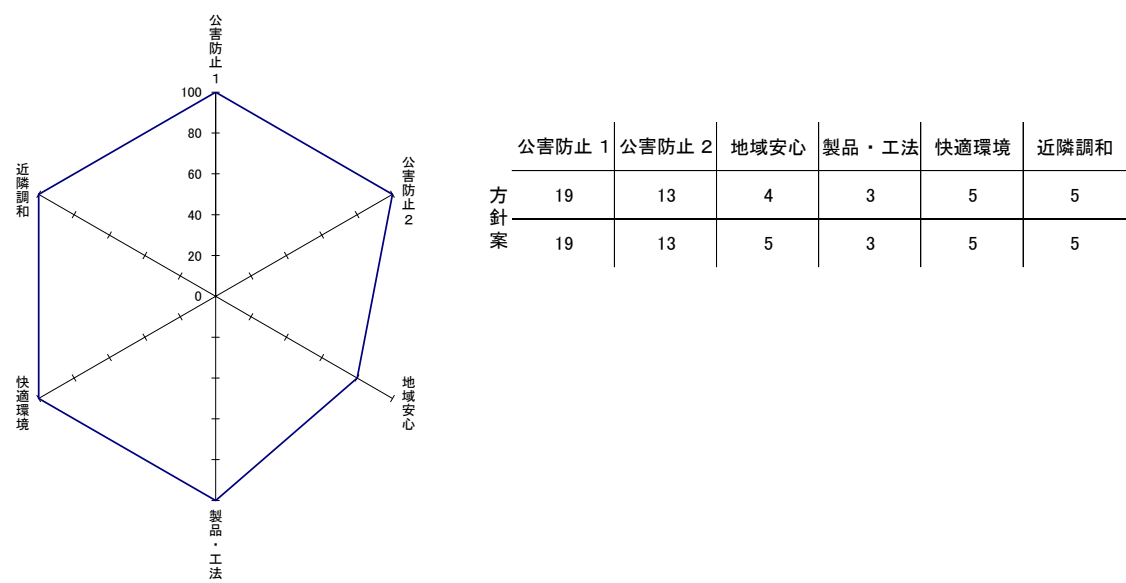

主な実施内容


工事に際しては、騒音や振動を最小限に抑える工法を採用します。
工事関連車両の走行ルートや時間帯は、周辺の道路状況や住居の立地を考慮し、一般交通や通学時間帯を避けて設定します。
また、近隣自治会などから地域の交通情報を収集し、事故防止に努めます。
さらに、エネルギー効率の高い機器を使用することで、燃料、電気、水道水などの消費量を抑制します。
工事規模に応じた効率的な工事計画を立案し、地域環境への負荷を軽減する計画を検討します。

環境まちづくりの概要(2)

1-2. 施設・設備等

実施率	81.8	パーセント	実施する・一部実施するの項目数	36
(小数点第2位以下切り捨て)			該当なしを除いた項目数	44

一:方針(案)

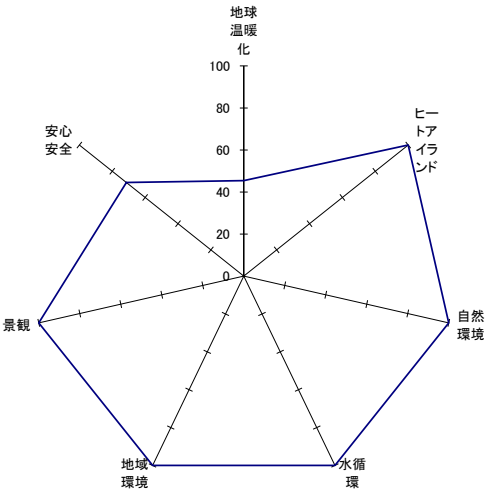

	地球温暖化	ヒートアイランド	自然環境	水循環	地域環境	景観	安心安全
方針	5	2	5	2	12	5	5
案	11	2	5	2	12	5	7

主な実施内容

(1)再生可能エネルギー・エネルギー効率の高いシステム・エネルギーを管理するシステムの導入

導入内容

空調、照明、給湯、換気、昇降機などの設備について、高効率や省エネルギー型の機器を検討します。

(2)緑地面積 緑化率 15.0 % 条例基準分 15.0 %以上

実施内容(緑化率に換算されない緑地(駐車場緑化・ベランダ緑化・花壇など)の面積など)

敷地内緑化の検討、緑化面積の確保の検討を行います。

(3)雨水利用 雨水貯留量 t うち雨水利用量 t

利用目的 【 ☐植栽水やり ☐トイレの流し水 ☐洗車 ☐その他 ()

(4)上記以外の主な実施内容

現段階では具体的な実施内容は決定していません。

環境まちづくりの概要(3)

2. その他(本ガイドライン記載の取組事項以外に実施する環境まちづくりの取組を記載ください。)

現段階では具体的な実施内容は決定していません。

●工事中におけるガイドライン取組事項チェックリスト

本事業を実施するにあたっては、事業による環境への影響を最小限にとどめるため、法律、条例等の規制基準を遵守することはもとより、以下のとおりガイドライン取組事項を実施します。

取 組 事 項	実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
大気汚染や騒音などの公害を防止します。		
建設機械		
1 低公害型建設機械の使用	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	排出ガス対策型、低騒音型や低振動型の建設機械をできる限り使用します。
2 低燃費型建設機械の使用	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	できる限り低燃費型の建設機械の使用をするように施工者に意思伝達します。
3 アイドリングの禁止	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	排出ガス、騒音の低減を図るため、アイドリングをしません。
4 環境に配慮した運転	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	空ぶかしを抑制するなど、環境に配慮した運転を行います。
5 稼働台数の抑制	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事規模に応じた効率的な工事計画を立て、稼働台数を抑制します。
6 工事の平準化	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	一時的に集中して稼働しないように工事の平準化を図ります。
7 機械類の整備点検	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	機械類は適切に整備点検を行います。
工事関連車両		
8 低公害、低燃費車の使用	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	燃費や排出ガス性能の良い車両を使用します。
9 工事関連車両の表示	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事関連車両であることを車両に表示します。
10 周辺状況に配慮した走行ルートや時間帯の設定	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事関連車両の走行ルートや時間帯は、周辺道路の状況、住居の立地状況などに配慮して、一般交通の集中時間帯や通学時間帯を避けて設定します。
11 建設資材の搬出入における車両台数の抑制	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設資材の搬出入計画において、適切な車種を選定することで車両台数を抑制します。
12 通勤等で利用する車両台数の抑制	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	作業従事者の通勤、現場監理などには、徒歩、二輪車、公共交通機関の利用、相乗りなどを奨励し、工事関連の車両台数を抑制します。
13 土砂の積み降ろし時の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	ダンプトラックによる土砂の積み降ろしの際には、騒音、振動や土砂の飛散防止に配慮します。
14 タイヤ洗浄	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺への土砂粉じん飛散を防止するため、現地でタイヤ洗浄を行います。

取 組 事 項		実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
15	ドラム洗浄時の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	コンクリートミキサー車のドラム洗浄を行う際には、騒音や水質汚濁に配慮します。
16	場外待機の禁止	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	原則として工事関連車両を場外に待機させませんが、車両入替等により一時的に場外待機となる場合があります。
17	クラクションの使用抑制	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	クラクションの使用は必要最小限にします。
18	アイドリングの禁止	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	自動車排出ガスの低減を図るため、アイドリングをしません。
19	環境に配慮した運転	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	空ぶかしを抑制するなど、環境に配慮した運転を行います。
工事方法 騒音・振動等			
20	防音シートなどの設置	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設作業時は、仮囲いと養生シートを設置し、解体作業時は、仮囲いと防音シートを設置します。なお、必要に応じて防音シートや防音パネルの設置等、さらなる防音対策を行います。
21	丁寧な作業	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設資材の落下を防止するなど、丁寧な作業を行います。
22	騒音や振動の少ない工法の採用	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	杭の施工などの際には、騒音や振動の少ない工法を採用します。
23	近隣への作業時間帯の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	騒音や振動を伴う作業は、近隣に配慮した時間帯に行います。
粉じん・アスベスト			
24	粉じん飛散防止対策	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺への粉じん飛散を防止するため、解体・掘削作業、土砂等の堆積場の設置等を行う場合は、散水等の粉じん飛散防止対策を行います。
25	アスベストの調査など	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	解体が無いため
26	アスベスト飛散防止対策	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	解体が無いため
水質汚濁・土壌汚染・地盤沈下			
27	濁水や土砂の流出防止	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	道路などへの濁水や土砂の流出を防止します。
28	塗料などの適正管理及び処分	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	塗料などの揮発を防止し、使用済みの塗料缶や塗装器具の洗浄液は適正に処分します。
29	土壌汚染対策	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	形質変更面積が 3,000 m ² 未満であり、法令の対象外であるため。

取 組 事 項		実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
30	地盤改良時の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	セメント及びセメント系改良剤を使用する地盤改良の際は、六価クロム溶出試験を実施し、土壌や地下水を汚染しないよう施工します。
31	周辺地盤、家屋などに配慮した工法の採用	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺地盤、家屋などに影響を及ぼさない工法を採用します。
悪臭・廃棄物			
32	アスファルト溶解時の臭気対策	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	アスファルトを熔融させる際は、場所の配慮、溶解温度管理など臭気対策を行います。
33	現地焼却の禁止	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	現地では廃棄物などの焼却は行いません。
34	解体時の環境汚染対策	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	解体が無いため
35	仮設トイレ設置時の臭気対策	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	仮設トイレを設置する場合は、適切なメンテナンス、設置場所の配慮などにより臭気対策を行います。
36	産業廃棄物の適正処理	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	産業廃棄物の適正処理を行います。
地域の安全安心に貢献します。			
37	地域との連携における事故の防止	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	近隣自治会などから地域の交通情報の聴き取りを行い、十分な人数の警備員を配置し事故防止に努めます。
38	児童などへの交通安全の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	児童や生徒が安全に登下校できるよう、工事現場周辺の交通安全に配慮します。
39	夜間や休日の防犯対策	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	夜間や休日に工事関係者以外の者が工事現場に立ち入らないよう出入口を施錠するなどの対策を講じます。
40	児童などへの見守り、声かけ	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	業務に影響のない範囲で、入りロゲートに配置する交通誘導員による見守りを行います。原則児童への声かけはしません。
41	地域の防犯活動への参加	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	地域からの要請があれば応じます
環境に配慮した製品及び工法を採用します。			
省エネルギー			
42	エネルギー消費の抑制	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	エネルギー効率のよい機器の利用などにより、工事中に使用する燃料、電気、水道水などの消費を抑制します。
省資源			
43	残土発生の抑制	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設発生土は現地での埋め戻しに使用するなど、残土の発生を抑制します。
44	廃棄物の減量	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	資材の梱包などを最小限にして廃棄物を減量します。

取 組 事 項		実 施 の 有 無		実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
快適な環境づくりに貢献します。				
景観				
45	仮囲い設置時の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	仮囲いの設置に当たっては、機能性を確保した上で景観面にも配慮します。	
46	仮設トイレ設置時の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	仮設トイレは、近隣住民や通行者に不快感を与えないよう、設置場所などを工夫します。	
周辺的环境美化				
47	周辺道路の清掃	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事現場内外を問わず、ポイ捨てを防止し、周辺道路の清掃を行います。	
48	場内整理	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	建設資材、廃棄物などの場内整理を行います。	
ヒートアイランド現象の緩和				
49	打ち水	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	夏期において水道水以外の用水が確保できる場合は、周辺道路などに打ち水を行います。	
地域との調和を図ります。				
工事説明・苦情対応				
50	工事内容の事前説明及び周知	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	近隣住民に工事実施前に工事概要、作業工程などを十分説明し、また工事実施中も適宜、現況と今後の予定をお知らせします。	
51	苦情対応	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事に関しての苦情窓口を設置し連絡先などを掲示するとともに、苦情が発生した際には真摯に対応します。	
周辺の教育・医療・福祉施設への配慮				
52	工事内容の事前説明及び工事計画の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事実施前に工事概要、作業工程などを十分説明するとともに、施設での行事や利用状況に配慮した工事計画にします。	
53	騒音、振動などの配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	騒音、振動、通風、採光などに特段の配慮をします。	
周辺の事業者との調整				
54	複合的な環境影響の抑制	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	工事が重複することによる複合的な騒音、振動、粉じん、工事車両の通行及びその他の環境影響を最小限に抑制するため、周辺地域における大規模な工事の状況を把握し、該当する事業者、工事施行者などと連絡を取り、可能な限り工事計画などを調整するように努めます。	

●施設・設備等に係るガイドライン取組事項チェックリスト

本事業を実施するにあたっては、法律、条例等の規制基準を遵守することはもとより、事業による環境への影響を最小限にとどめ、また、新たな環境負荷の発生を事前に防止するとともに、地域の環境レベル向上に貢献するため、以下のとおりガイドライン取組事項を実施します。

取 組 事 項	実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
地球温暖化対策を行います。		
55 大阪府建築物の環境配慮制度及び大阪府建築物環境性能表示制度の活用	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	大阪府建築物の環境配慮制度において高い評価を得られるように努めるとともに、その評価結果を大阪府建築物環境性能表示制度により、広告物などに表示します。
56 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)設計	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	現段階では具体的な決定はしていません。
57 再生可能エネルギーの活用	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	現段階では具体的な決定はしていません。
58 エネルギー効率の高いシステムの導入	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	現段階では具体的な決定はしていません。
59 エネルギーを管理するシステムの導入	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	現段階では具体的な決定はしていません。
60 冷媒漏えい(使用時排出)の防止	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	現段階では具体的な決定はしていません。
61 建築物のエネルギー負荷の抑制	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	採光や通風性の考慮や断熱性能を向上させることで、建築物のエネルギー負荷の抑制に努めます。
62 長寿命な建築物の施工	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	基本構造の耐久性を高め、長寿命の建築物を施工します。
63 環境に配慮した製品の採用	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	グリーン購入法適合品、エコマーク商品などの環境保全に配慮した製品をできる限り採用します。
64 木材(国産材、大阪府内産材)の利用	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	木材(国産材、大阪府内材)の環境保全に配慮した製品をできる限り採用します。
65 電気自動車用充電設備の設置	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	現段階では具体的な決定はしていません。
66 宅配ボックスの設置	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	施設の運営中の受け取りが可能なため。
ヒートアイランド対策を行います。		
67 建物屋根面、壁面の高温化抑制	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による配慮を行います。
68 地表面の高温化抑制	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による配慮を行います。
自然環境を保全し、みどりを確保します。		
69 動植物の生息や生育への配慮	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	動植物の生息や生育環境の配慮に努めます。
70 地域のシンボルツリーの保全	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	該当する樹木はありません。
71 既存の植生の保全	☐ 実施する ☒ 一部実施する	可能な限り左記による配慮を行います。

取 組 事 項	実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
〇 既存の機上の休工	☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限りの処置を行います。

取 組 事 項		実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
72	地域に応じたみどりの創出	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	事業計画地に隣接する緑地などと連続させてみどりを配置するなど、地域に応じた創意工夫によりみどりを創出し、良好な景観や生物の育成空間の形成に努めます。
73	駐車場緑化	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	地上での緑地確保に努めます。
74	屋上緑化など	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	地上での緑地確保に努めます。
75	法面緑化	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	開発により生じた緑化面積を確保します。
76	植栽樹種の選定	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り地域性に合う樹種の選定に努めます。
水循環を確保します。			
77	水資源の有効利用	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	左記による設置の予定はありません。
78	雨水流出を抑制する施設の設置	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	下水道課と協議します。
79	雨水浸透への配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	下水道課と協議します。
地域の生活環境を保全します。			
大気・騒音・振動等			
80	騒音や振動を発生させる設備設置時の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	空調機等の騒音や振動を発生させる設備においては、低騒音型機器の採用、設置場所に配慮するなど、対策を行います。
81	住宅における防音サッシ等の設置	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺状況の確認によりサッシの選定を行います。
82	駐車場の配置計画時の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺環境への自動車の排気ガスや騒音に配慮した駐車場計画に努めます。
83	近隣への悪臭及び騒音の配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	近隣への悪臭、騒音などに配慮した計画に努めます。
84	ボイラーなどの機器設置時の排出ガス対策	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	ボイラーなどの機器設置がないため。
85	屋外照明や広告照明設置時の配慮	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による配慮を行います。
86	建築資材による光の影響の考慮	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による配慮を行います。
87	環境に配慮した塗料の使用	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	塗料は、水性塗料や揮発性有機化合物(VOC)の含有率が低いものを使用します。
88	周辺の教育、福祉や医療施設への配慮	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による配慮を行います。

取 組 事 項	実 施 の 有 無	実 施 内 容 (実施、一部実施する場合は、その内容及び方法、実施しない及び該当なしの場合は理由を記入してください。)
中高層建築物(高さ10メートルを超える建築物)		
89 日照障害対策	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	事前に周辺住民へ説明を行います。
90 電波障害の事前把握及び近隣説明	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	事前に周辺住民へ説明を行います。
91 電波障害発生時の改善対策	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	電波障害が生じた場合は、改善対策を行います。
92 プライバシーの配慮	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	近隣住民のプライバシーを侵害するおそれがある場合は、適切な対策を講じるよう努めます。
景観まちづくりに貢献します。		
93 地域への調和	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺地域性に調和したものとなるよう配慮します。
94 景観まちづくり計画の目標と方針に基づいた計画及び設計	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による配慮を行います。
95 景観形成に関わるガイドラインや方針に配慮した計画及び設計	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による計画に努めます。
96 重点地区指定に向けた協議	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☒ 該当なし	本計画区域は1ha未満なので協議を行う予定はありません。
97 景観形成基準の遵守	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	景観形成基準を遵守します。
98 屋外広告物の表示などに関する基準の遵守	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による計画に努めます。
安心安全のまちづくりに貢献します。		
99 歩行者が安全に通行できる工夫	☒ 実施する ☐ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	周辺状況に応じ、計画地内において、歩行者が安全に通行できる空間を整備します。
100 災害に対する建築物・工作物の強靱性を高める取組	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による整備に努めます。
101 災害時の自立性を維持する取組	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による整備に努めます。
102 災害時に備えた地域等との連携に関わる取組	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による整備に努めます。
103 災害時の避難や救助等の応急対応に関する取組	☐ 実施する ☒ 一部実施する ☐ 実施しない ☐ 該当なし	可能な限り左記による整備に努めます。
104 犯罪を発生させない都市(まち)づくりに関する取組	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	現段階では具体的な決定はしておりません。
105 犯罪に備えた地域等との連携に関わる取組	☐ 実施する ☐ 一部実施する ☒ 実施しない ☐ 該当なし	現段階では具体的な決定はしておりません。
